

PM Checkpoint 1 阶段项目进度表

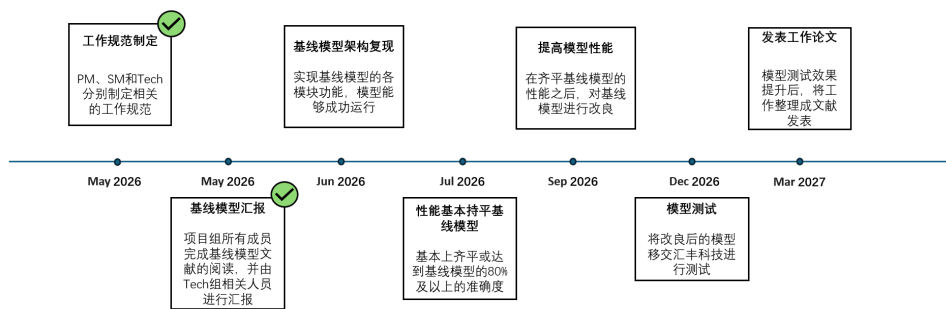


图 1: 项目总体计划

任务 ID	项目 / 项目描述	人数	启动日期	完成日期	工时	完成度
1	【阶段一】前期工作		2026/04/22	2026/05/15	23d	100%
1.1	【建立依赖图】梳理任务/人数/排期，锁定环境权限	PM1 人	2026/04/22	2026/05/6	15d	100%
1.2	【协作环境准备】创建 Confluence 进行知识管理与团队协作	PM 全体	2026/05/6	2026/05/8	3d	100%
1.3	【协作工具与机制】熟悉 Confluence，接入 Tech 组例会机制	PM1 人 +SM1 人	2026/05/8	2026/05/9	2d	100%
1.4	【PM 前期工作】创建统一的工作报告、安排模板文件，进行分工	@ PM1 人	2026/05/7	2026/05/9	3d	100%

任务 ID	项目 / 项目描述	人数	启动日期	完成日期	工时	完成度
1.5	【Scrum Master 前期工作】 创建统一的工作报告、安排模板文件，制定工作标准和流程，进行分工	@SM 全体	2026/05/8	2026/05/11	3d	100%
1.6	【Tech 组前期工作】Tech 组成员构建本地开发环境及项目协作环境 (git)，例会日期的指定，基础技能培训；定制 git 提交规范，包括代码风格、注释的规范等	@Tech 全体	2026/05/9	2026/05/15	6d	100%
2	【阶段二】项目起步		2026/05/15	2026/06/02	19d	100%
2.1	【基线模型汇报】每个 Tech 成员单独汇报其对基线模型的理解	@Tech 4 人	2026/05/15	2026/05/18	3d	100%
2.2	【项目架构构建及方案撰写】 构建项目流程图，设计接口、代码框架和实现功能	@Tech 4 人	2026/05/18	2026/05/24	6d	100%
2.3	【方案评审】组织 Proposal 评审会 (PM 对接导师，组长汇报，全体参与)	@PM 1 人	2026/05/25	2026/05/25	1d	100%

任务 ID	项目 / 项目描述	人数	启动日期	完成日期	工时	完成度
2.4	【文档输出】整理并发布评审记录及待办项	@SM 1 人	2026/05/25	2026/05/26	1d	100%
2.5	【技术分工】根据项目架构的各部分设计进行分工	@PM 1 人	2026/05/26	2026/05/27	1d	100%
2.6	【工作安排】为每一个技术部分做时限规划	@SM 1 人	2026/05/28	2026/05/30	2d	100%
2.7	【规划制定】制定 CP2 Roadmap 路线图	@PM 全体	2026/05/30	2026/06/02	3d	100%
3	【阶段三】端到端原型开发		2026/06/02	2026/06/22	20d	0%
3.1	【模块开发】数据准备 → 加密/表示	@Tech 2 人	2026/06/02	2026/06/07	5d	0%
3.2	【模块开发】聚类增强 → 模糊匹配	@Tech 3 人	2026/06/07	2026/06/15	8d	0%
3.3	【系统联调】完成端到端链路集成与结果输出测试	@Tech 2 人	2026/06/15	2026/06/18	3d	0%
3.4	【代码配置】输出原型代码及配置/版本说明文档	@Tech 2 人	2026/06/18	2026/06/22	4d	0%
4	【阶段四】性能基线建立与验收		2026/06/22	2026/07/08	16d	0%

任务 ID	项目 / 项目描述	人数	启动日期	完成日期	工时	完成度
4.1	【运行验证】在小规模数据上验证原型可复现运行	@Tech 2 人	2026/06/22	2026/06/25	3d	0%
4.2	【基线测试】建立 Baseline (准确性/召回/延迟/吞吐/成本)	@Tech 2 人	2026/06/25	2026/07/01	6d	0%
4.3	【分析报告】Baseline 数据瓶颈分析，输出 Baseline 报告	@Tech 2 人	2026/07/01	2026/07/04	3d	0%
4.4	【优化清单】形成可执行的 CP2 优化清单进入 Backlog	@Tech 1 人 + PM 1 人	2026/07/04	2026/07/08	4d	0%
5	【阶段五】兜底预案与调整 (触发条件：未达标)		2026/07/08	2026/07/15	7d	0%
5.1	【原因复盘】分析未达标原因 (技术/数据/环境限制)	@PM 2 人	2026/07/08	2026/07/10	2d	0%
5.2	【方案降级】设计替代路径/降级方案 (如减少密文操作等)	@Tech 2 人	2026/07/10	2026/07/13	3d	0%
5.3	【计划修正】制定 CP2 修正计划 (时间/资源/优先级调整)	@PM 1 人	2026/07/13	2026/07/15	2d	0%
关键交付与验收节点						

任务 ID	项目 / 项目描述	人数	启动日期	完成日期	工时	完成度
M1	Proposal 评审会			2026/05/25	交付点	
M2	原型代码及配置文档输出			2026/06/22	交付点	
M3	Baseline 报告 + 优化清单			2026/07/08	交付点	
M4	兜底预案与 CP2 修正计划			2026/07/15	交付点	
